

1

ทางหลวงหมายเลข 2318 ตอน ทุ้งใหญ่ – ทุ้งฝน



1. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (อด.2/3/67 ลว.31 ม.ค. 68)

- ทางหลวงหมายเลข 2318 ตอน ทุ้งใหญ่ - ทุ้งฝน ช่วง กม.0+000 – กม.7+524 (ดำเนินการเป็นช่วง ๆ)
- ระยะทางประมาณ : 7.524 กิโลเมตร (ดำเนินการเป็นช่วง ๆ)
- ครอบคลุมพื้นที่ : ตำบลทุ้งใหญ่, ตำบลทุ้งฝน อำเภอทุ้งฝน จังหวัดอุดรธานี
- วันเริ่มสัญญา : 1 ก.พ. 68 วันสิ้นสุดสัญญา : 1 พ.ค. 67 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
- งบประมาณตามสัญญา : 4,168,429.14 บาท
- ความคืบหน้าของโครงการ : แล้วเสร็จ 50 % (-)
- สถานการณ์เบิกจ่าย : เบิกล่วงหน้า - % เป็นเงิน - บาท (กันเหลื่อมปี)
- อุปสรรคของโครงการ :
- ไม่มี

3

1

ทางหลวงหมายเลข 2318 ตอน ทุ้งใหญ่ – ทุ้งฝน



ภาพกิจกรรมก่อสร้าง



4

2

ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า – ดอนกลอย



2. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (อด.2/13/67 ลว.7 ก.พ. 68)

- ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ช่วง กม.10+860 – กม.12+700
- ระยะทางประมาณ : 1.840 กิโลเมตร
- ครอบคลุมพื้นที่ : ตำบลสามพร้าว อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
- วันเริ่มสัญญา : 8 ก.พ. 68 วันสิ้นสุดสัญญา : 8 พ.ค. 67 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
- งบประมาณตามสัญญา : 20,986,371.66 บาท
- ความคืบหน้าของโครงการ : แล้วเสร็จ 30 % (-)
- สถานการณ์เบิกจ่าย : เบิกล่วงหน้า - % เป็นเงิน - บาท (กันเหลื่อมปี)
- อุปสรรคของโครงการ :
- ไม่มี

5

2

ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า – ดอนกลอย



ภาพกิจกรรมก่อสร้าง



6

3

ทางหลวงหมายเลข 2255 ตอน นาข่า – สุ่มเส้า



3. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)

- ทางหลวงหมายเลข 2255 ตอน - ดอนกลอย ช่วง กม.8+000 – กม.11+170
- ระยะทางประมาณ : 3.170 กิโลเมตร
- ครอบคลุมพื้นที่ : ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
- วันเริ่มสัญญา : - วันสิ้นสุดสัญญา : - ระยะเวลาดำเนินการ - วัน
- งบประมาณตามสัญญา : 15,000,000.00 บาท
- ความคืบหน้าของโครงการ : แล้วเสร็จ 0 % (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)
- สถานการณ์เบิกจ่าย : เบิกล่วงหน้า - % เป็นเงิน - บาท (กันเหลือมปี)
- อุปสรรคของโครงการ :
- ไม่มี

7

3

ทางหลวงหมายเลข 2255 ตอน นาข่า – สุ่มเส้า



ภาพกิจกรรมก่อสร้าง

อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

8



4. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568


กิจกรรมงานปรับปรุงทางหลวง (อด.2/2/68 ลว.29 ม.ค. 68)

- ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง ช่วง กม.27+000 – กม.29+200
- ระยะทางประมาณ : 2.200 กิโลเมตร
- ครอบคลุมพื้นที่ : ตำบลสมเสา อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
- วันเริ่มสัญญา : 30 ม.ค. 68 วันสิ้นสุดสัญญา : 28 มิ.ย. 68 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
- งบประมาณ : 29,555,954.75 บาท
- ความสำเร็จของโครงการ : 20.00 %
- สถานการณ์เบิกจ่าย : - เป็นเงิน - บาท (กันเหลื่อมปี)
- อุปสรรคของโครงการ :
 - ติดขัดเสาไฟฟ้า ในพื้นที่การดูแลของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเพ็ญ
 - ติดขัดท่อประปาชุมชน ในพื้นที่การดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมเสา



ภาพกิจกรรมก่อสร้าง



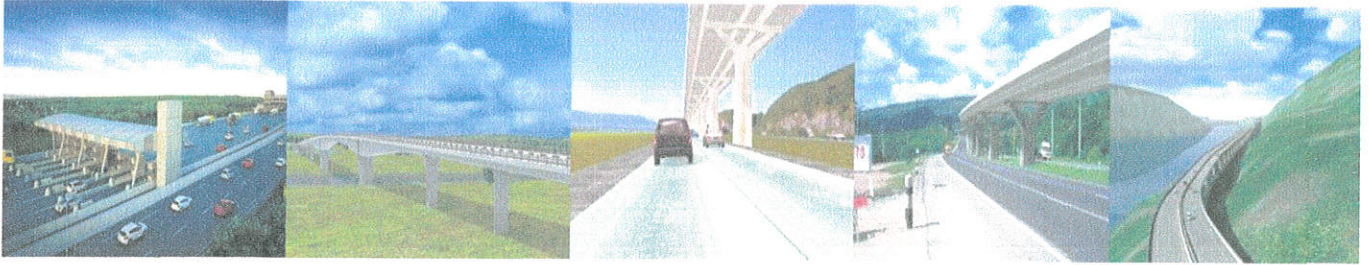

จบการนำเสนอ

แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)

สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

กรมทางหลวง
