



กรมชลประทาน

สถานการณ์น้ำและ การบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2569


โครงการชลประทานสุโขทัย
สำนักงานชลประทานที่ 4





การบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัย

ข้อมูลวันที่ 3 สิงหาคม 2569

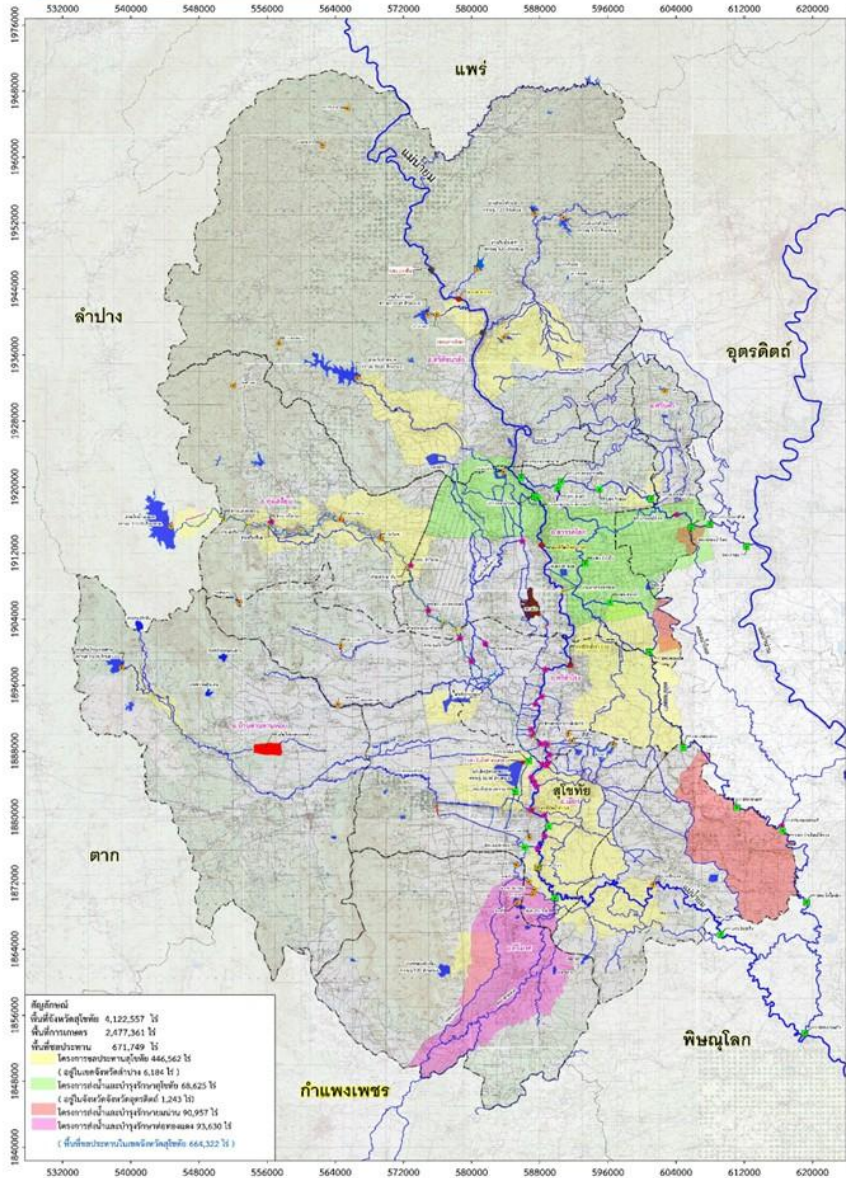

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,259.2 มม. 20 ปี) ปริมาณน้ำฝนสะสม (ปี 2569) 332.4 มม.
(ข้อมูล สถานีอุตุนิยมวิทยา อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย)

ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 2,702 ล้าน ลบ.ม. (ปีน้ำ 2508-2567) (ข้อมูลศูนย์อุทกวิทยาคอนล่าง) ปริมาณน้ำท่าสะสมปัจจุบัน (ปี 2569) 257.098 ล้าน ลบ.ม.

แหล่งน้ำ และน้ำใช้การ (จุเก็บกักรวม 419.222 ล้าน ลบ.ม.) น้ำใช้การทั้งจังหวัด 203.314 ล้าน ลบ.ม.

ในเขตชลประทาน 2232285	จำนวน (แห่ง)	ความจุเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	น้ำใช้การ (ล้าน ลบ.ม.)	% ใช้การ
โครงการ ขป. ขนาดใหญ่	1	94.100	28.880	30.69
โครงการ ขป. ขนาดกลาง	17	184.530	107.217	54.78
โครงการ ขป. ขนาดเล็ก	1	1.620	1.320	81.84
โครงการ ขป. (น้ำใต้ดิน)	204	60.000	14.746	58.17
รวม		340.130	152.163	
นอกเขตชลประทาน	จำนวน (แห่ง)	ความจุเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)	
1. อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก	9	11.270	7.229	
2. โครงการชลประทานประเภทแหล่งน้ำอื่น ๆ	17	40.440	22.231	
3. แหล่งน้ำกรมทรัพยากรน้ำ	171	19.550	15.757	
4. สระเก็บน้ำในไร่นา	6,216	7.832	5.934	
รวม		79.092	51.151	

พื้นที่ทำการเกษตรฤดูฝนปี 2569 ในเขตชลประทาน จังหวัดสุโขทัย (4 โครงการ)



	แผน (ไร่)	ผล (ไร่)	เก็บเกี่ยวไร่
ข้าว	460,648	486,532	4,570
พืชไร่-พืชผัก	62,735	62,542	
รวม	523,383	549,074	4,570

ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2569

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
และขนาดกลาง จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 3 สิงหาคม 2569
(เวลา 06.00 น.)



โครงการชลประทานสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

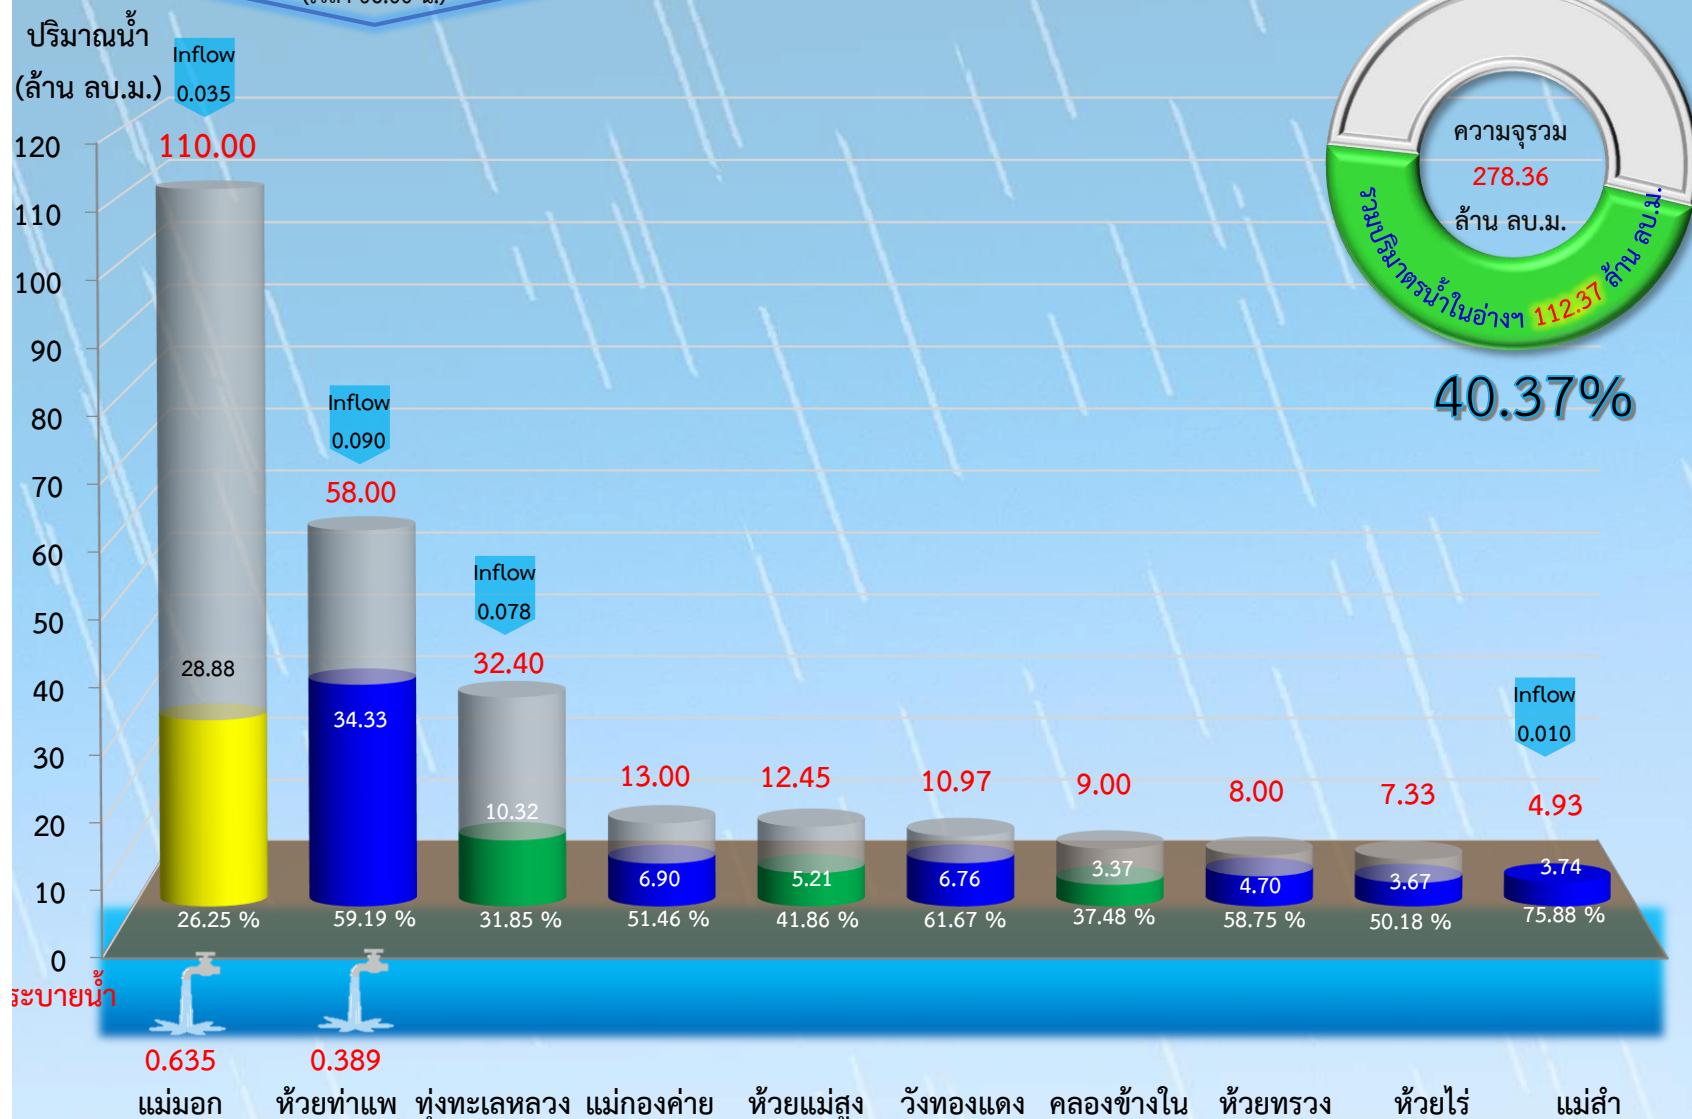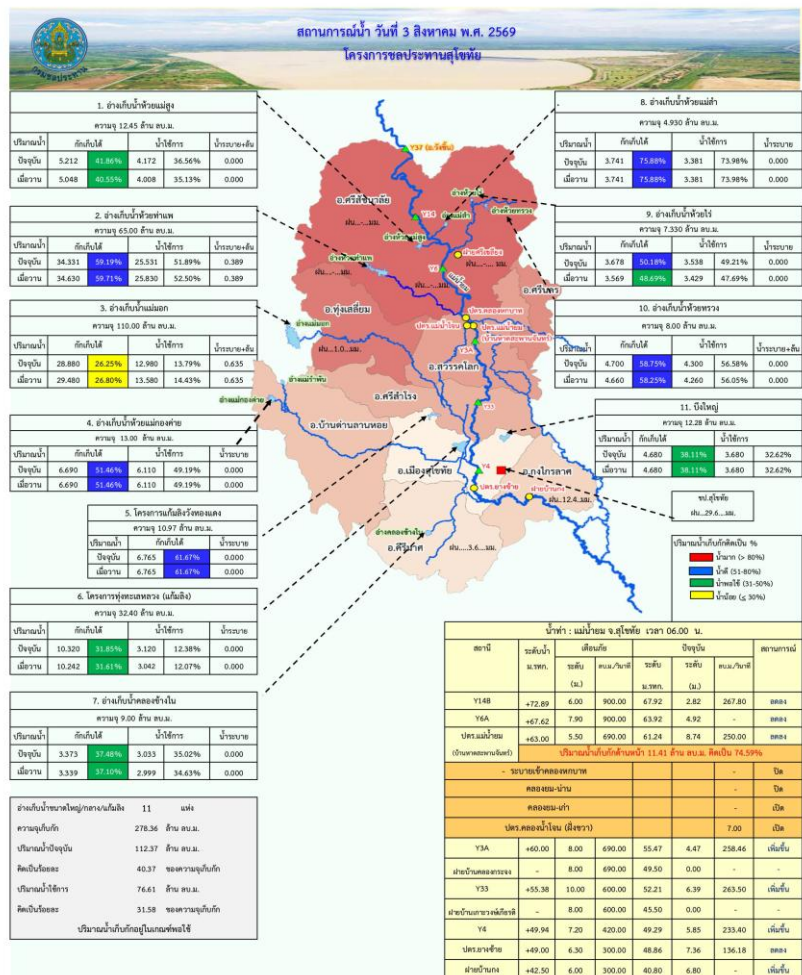

เกณฑ์ปริมาณน้ำ

81% ขึ้นไป เกือบน้ำมาก

51 – 80% เกณฑ์น้ำดี

31 - 50% เกณฑ์พอใช้

≤ 30% เกณฑ์น้ำน้อย

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม (ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2569)

		Y 20		Y1C		Y37		Y14B		ปตร.แม่น้ำยม			Y3A		Y33		Y4		ปตร.บ้านยางซ้าย		Y.15		หัวฝายแม่มอก			
ระยะเวลาดำเนินการ		91 กม. = 24 ชม.		106 กม. = 25 ชม.		61.80 กม. = 15 ชม.		33.30 กม. = 5 ชม.		(บ้านหาดสะพานจันทร์)			22.60 กม. = 6 ชม.		27.72 กม. = 5 ชม.		9.85 กม. = 6 ชม.		35.20 กม. = 2 ชม.		15.8 กม. = 6 ชม.					
ของน้ำ(ปกติ)		9.28 กม. = 1 ชม.																								
ว/ด/ป	เวลา (น.)	Y 20		Y1C บ.น้ำโด่ง		Y.37 บ.วังชัน		Y.14B บ.แม่สำเหนือ		ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์)			Y.3A ในเมือง		Y.33 คลองตาล		Y.4 หน้าจวนผู้ว่าฯ		ปตร.บ้านยางซ้าย		Y.15		หัวฝายแม่มอก อ.ฉิม จ.ลำปาง		เวลา (น.)	
		อ.สอง จ.แพร่ (ระดับตลิ่งสูง 8.10 ม.) ZG+181.000 ม.(รทม.) (ปริมาณน้ำสูงสุด 710.50 (ฝายระวัง 400 cms)		อ.เมือง จ.แพร่ (ระดับตลิ่งสูง 8.20 ม.) ZG+143.500 ม.(รทม.) (ปริมาณน้ำสูงสุด 992.00 (ฝายระวัง 400 cms)		อ.วังชัน จ.แพร่ (ระดับตลิ่งสูง 11.00 ม.) ZG+92.250 ม.(รทม.) (ปริมาณน้ำสูงสุด 1,330.40 (ฝายระวัง 400 cms)		อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (ระดับตลิ่งสูง 11.30 ม.) ZG+62.010 ม.(รทม.) (ปริมาณน้ำสูงสุด 2,293.50 (ฝายระวัง 400 cms)		อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (ระดับตลิ่งสูง 10.50 ม.) ZG+52.50 ม.(ร.ท.ก.) (ปริมาณน้ำสูงสุด 1,800.00 cms) (ฝายระวัง 400 cms)			อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (ระดับตลิ่งสูง 11.00 ม.) ZG+51.000 ม.(รทม.) (ปริมาณน้ำสูงสุด 1,130.00 cms) (ฝายระวัง 400 cms)		อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย (ระดับตลิ่งสูง 11.17 ม.) ZG+45.820 ม.(รทม.) (ปริมาณน้ำสูงสุด 690.00 (ฝายระวัง 400 cms)		อ.เมือง จ.สุโขทัย (ระดับตลิ่งสูง 8.15 ม.) ZG+43.440 ม.(รทม.) (ปริมาณน้ำสูงสุด 510.00 (ฝายระวัง 300 cms)		อ.เมือง จ.สุโขทัย (ระดับตลิ่งสูง 7.50 ม.) ZG+41.50 ม.(ร.ท.ก.) (ปริมาณน้ำสูงสุด 630.00 cms) (ฝายระวัง 300 cms)		อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (ระดับตลิ่งสูง 10.32 ม.) ZG+35.320 ม.(รทม.) (ปริมาณน้ำสูงสุด 492.00 cms) (ฝายระวัง 300 cms)		ระดับตลิ่ง 5.88 ม. ZG+100.380 ม.(รทม.) (ปริมาณน้ำสูงสุด 290.00 cms)			
		(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)	(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)	(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)	(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)	(ม.)	ความจุ	(ลบ.ม./วินาที)	(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)	(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)	(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)	(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)	(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)	(ม.)	(ลบ.ม./วินาที)		
29-ก.ค.-69	06.00	2.32	63.76	1.40	30.00	2.96	57.86	1.14	36.92	8.63	11.10	"	-0.82	*	0.48	*	1.08	*	2.89	"	3.73	NA	1.37	8.74	06.00	
	12.00	2.16	56.14	1.69	67.70	2.69	41.85	1.57	81.97	8.96	12.03	58.00	-0.83	*	0.48	*	1.08	*	2.89	"	3.74	NA	1.37	8.74	12.00	
	18.00	1.88	43.36	1.71	70.30	2.54	34.00	1.59	84.60	8.96	12.03	62.00	0.47	*	0.49	*	1.08	*	2.87	"	3.75	NA	1.36	8.67	18.00	
30-ก.ค.-69	06.00	2.47	71.03	1.83	86.05	2.49	31.50	1.32	53.21	8.84	11.69	55.00	0.96	*	2.23	*	1.08	*	2.84	"	3.75	NA	1.36	8.67	06.00	
	12.00	3.51	127.60	1.92	98.30	2.55	34.50	1.20	41.96	8.84	11.69	55.00	0.74	*	2.61	*	1.08	*	2.84	"	3.76	NA	1.36	8.67	12.00	
	18.00	3.41	121.60	2.65	198.50	2.76	45.84	1.13	36.12	8.50	10.74	35.00	0.65	*	2.52	*	1.40	*	4.08	"	3.77	NA	1.36	8.67	18.00	
31-ก.ค.-69	06.00	3.31	115.60	3.56	299.20	3.17	72.00	1.13	36.12	8.49	10.71	35.00	0.10	*	2.14	*	2.66	*	5.56	"	3.79	NA	1.37	8.74	06.00	
	12.00	3.39	120.40	3.45	286.50	3.60	104.90	1.26	47.38	8.49	10.71	35.00	0.10	*	1.99	*	2.65	*	5.50	"	3.79	NA	1.37	8.74	12.00	
	18.00	2.90	92.80	3.40	281.00	4.41	177.50	1.40	61.61	8.55	10.88	35.00	0.13	*	1.94	*	2.26	*	4.99	25.22	3.81	NA	1.36	8.67	18.00	
	19.00	2.89	92.28	3.43	284.30	4.54	190.50	1.42	63.83	8.59	10.99	35.00	0.12	*	1.94	*	2.20	*	4.96	25.32	3.81	NA	1.36	8.67	19.00	
	20.00	2.93	94.36	3.42	283.20	4.67	203.50	1.45	67.24	8.61	11.04	35.00	0.11	*	1.94	*	2.15	*	4.94	24.95	3.82	NA	1.36	8.67	20.00	
1-ส.ค.-69	21.00	2.93	94.36	3.42	283.20	4.67	203.50	1.47	69.57	8.64	11.13	35.00	0.10	*	1.95	*	2.10	*	4.91	24.91	3.84	NA	1.36	8.67	21.00	
	06.00	2.86	90.72	3.20	259.00	5.35	277.30	1.96	142.50	8.62	11.07	80.00	1.28	*	2.20	*	1.76	*	4.81	24.61	4.01	NA	1.37	8.74	06.00	
	12.00	2.85	90.20	2.96	232.60	5.38	280.60	2.54	227.20	8.88	11.80	155.00	1.61	*	2.84	*	1.85	*	4.81	24.61	4.09	NA	1.37	8.74	12.00	
	18.00	2.76	85.56	2.80	215.00	5.34	276.20	2.87	275.30	9.09	12.41	249.00	2.72	*	3.44	*	2.50	*	5.39	26.39	4.15	NA	1.36	8.67	18.00	
2-ส.ค.-69	06.00	2.49	72.01	2.66	199.60	5.23	264.10	3.13	315.50	9.25	12.89	318.00	3.96	*	5.32	*	3.40	*	7.50	31.82	4.25	NA	1.37	8.74	06.00	
	12.00	2.52	73.48	2.73	207.30	5.09	248.70	3.09	309.20	9.20	12.74	305.00	4.35	249.42	5.83	224.80	5.61	216.30	7.06	173.96	4.44	NA	1.36	8.67	12.00	
	18.00	2.49	72.01	2.74	208.40	4.96	234.40	3.04	301.30	9.02	12.20	285.00	4.57	266.08	6.17	248.00	5.60	215.70	7.29	137.78	5.10	NA	1.36	8.67	18.00	
3-ส.ค.-69	06.00	2.45	70.05	2.62	195.20	4.83	220.32	2.82	267.80	8.74	11.41	250.00	4.47	258.46	6.39	263.50	5.85	233.40	7.36	136.18	5.72	NA	1.37	8.74	06.00	
	12.00																							12.00		
	18.00																							18.00		

รายงานการรื้อทำนบกั้นดิน (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569)

รายงานการรื้อย้ายทำนบกั้นดิน คลองหกบาทและคลองยม-น่าน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	ตำแหน่งทำนบกั้นดิน	อาคาร/สิ่งก่อสร้าง	แนวรื้อย้าย เดิม/ใหม่	ภาพถ่ายก่อนรื้อย้าย	ผลการดำเนินการ			ภาพถ่ายหลังรื้อย้าย
					ขุดลอก/ย้าย	กำจัด ดิน/หิน	รื้อย้ายแล้ว เสร็จ	
1	กม.0+000 คลองหกบาท	ประตูระบายน้ำคลอง หกบาท	31 พ.ค.69				✓ 14 มิ.ย.69	
2	กม.2+600 คลองหกบาท	ประตู 1 ขวา	5-7 ส.ค.69		✓			
3	กม.4+700 คลองหกบาท	สะพานรถยนต์	7-8 ส.ค.69				✓ 15 มิ.ย.69	
4	กม.5+000 คลองหกบาท	สะพานรถยนต์	5-7 ส.ค.69		✓			
5	กม.0+700 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	7 ส.ค.69				✓ 27 พ.ค.69	
6	กม.1+800 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	30 พ.ค.69				✓ 18 มิ.ย.69	
7	กม.2+200 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	5-7 ส.ค.69		✓			
8	กม.2+700 คลองยม-น่าน	สะพานรถยนต์ (ทข)	5-7 ส.ค.69		✓			
9	กม.5+200 คลองยม-น่าน	สะพานรถยนต์ (ทข)	7 ส.ค.69				✓ 22 มิ.ย.69	
10	กม.6+000 คลองยม-น่าน	ประตูระบายน้ำ (วังทอง)	7 ส.ค.69				✓ 25 มิ.ย.69	
11	กม.8+900 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	7 ส.ค.69				✓ 7 มิ.ย.69	

หน้า 1

ลำดับ	ตำแหน่งทำนบกั้นดิน	อาคาร/สิ่งก่อสร้าง	แนวรื้อย้าย เดิม/ใหม่	ภาพถ่ายก่อนรื้อย้าย	ผลการดำเนินการ			ภาพถ่ายหลังรื้อย้าย
					ขุดลอก/ย้าย	กำจัด ดิน/หิน	รื้อย้ายแล้ว เสร็จ	
12	กม.10+400 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	7 ส.ค.69				✓ 3 มิ.ย.69	
13	กม.12+100 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	17 มิ.ย.69				✓ 1 มิ.ย.69	
14	กม.12+300 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	17 มิ.ย.69				✓ 29 พ.ค.69	
15	กม.12+500 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	7 ส.ค.69				✓ 29 พ.ค.69	
16	กม.14+880 คลองยม-น่าน	ประตูระบายน้ำ (หนองปรือกรรณ)	4-7 ส.ค.69		✓			
17	กม.16+300 คลองยม-น่าน	นาเกลือ+สะพานรถยนต์	5-7 ส.ค.69		✓			
18	กม.19+100 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	7 ส.ค.69				✓ 30 พ.ค.69	
19	กม.19+800 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	7 ส.ค.69				✓ 18 มิ.ย.69	
20	กม.20+640 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	7 ส.ค.69				✓ 29 มิ.ย.69	
21	กม.21+000 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	5 มิ.ย.69				✓ 29 มิ.ย.69	
22	กม.21+700 คลองยม-น่าน	คลองหาคดคอนกรีต	7 มิ.ย.69				✓ 12 มิ.ย.69	
23	กม.23+600 คลองยม-น่าน	สะพานรถยนต์	4-5 ส.ค.69		✓			

หน้า 2



ลำดับ	ตำแหน่งทำนบกั้นดิน	อาคาร/สิ่งก่อสร้าง	แนวรื้อย้าย เดิม/ใหม่	ภาพถ่ายก่อนรื้อย้าย	ผลการดำเนินการ			ภาพถ่ายหลังรื้อย้าย
					ขุดลอก/ย้าย	กำจัด ดิน/หิน	รื้อย้ายแล้ว เสร็จ	
24	กม.25+200 คลองยม-น่าน	สะพานรถยนต์	5-7 ส.ค.69		✓			
25	กม.27+300 คลองยม-น่าน	สะพานรถยนต์	17-20 ส.ค.69		✓			
26	กม.28+100 คลองยม-น่าน	พืชน้ำคลอง	7 ส.ค.69				✓ 28 มิ.ย.69	
27	กม.29+360 คลองยม-น่าน	สะพานรถยนต์	7-10 ส.ค.69		✓			
28	กม.30+300 คลองยม-น่าน	ประตูระบายน้ำ	16-20 ส.ค.69		✓			
29	กม.34+340 คลองยม-น่าน	สะพานรถยนต์ (ทล)	5-7 ส.ค.69		✓			

สรุปรายการทั้งหมด

ทำนบกั้นดิน	29	แห่ง
ขุดลอก/ย้ายแล้ว	17	แห่ง
อยู่ระหว่างขุดลอก/ย้าย	0	แห่ง
คงเหลือทำนบกั้นดิน	12	แห่ง

หน้า 3

แนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

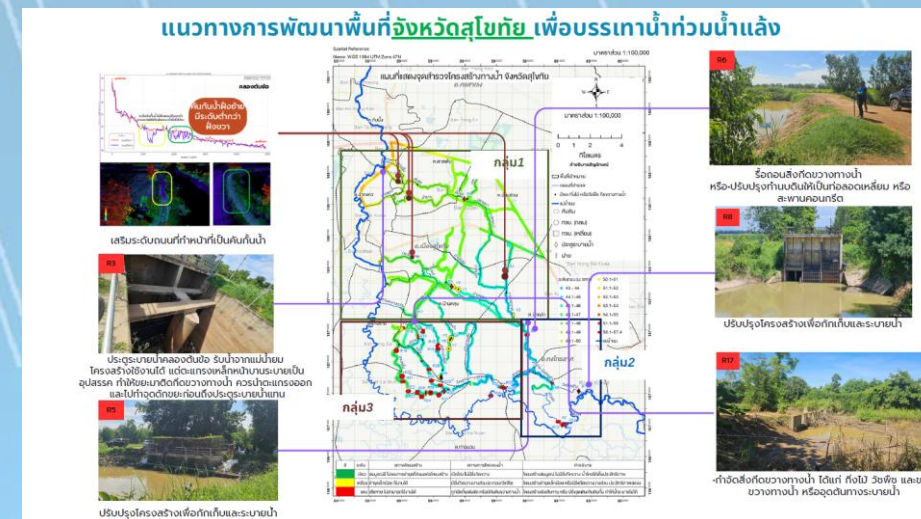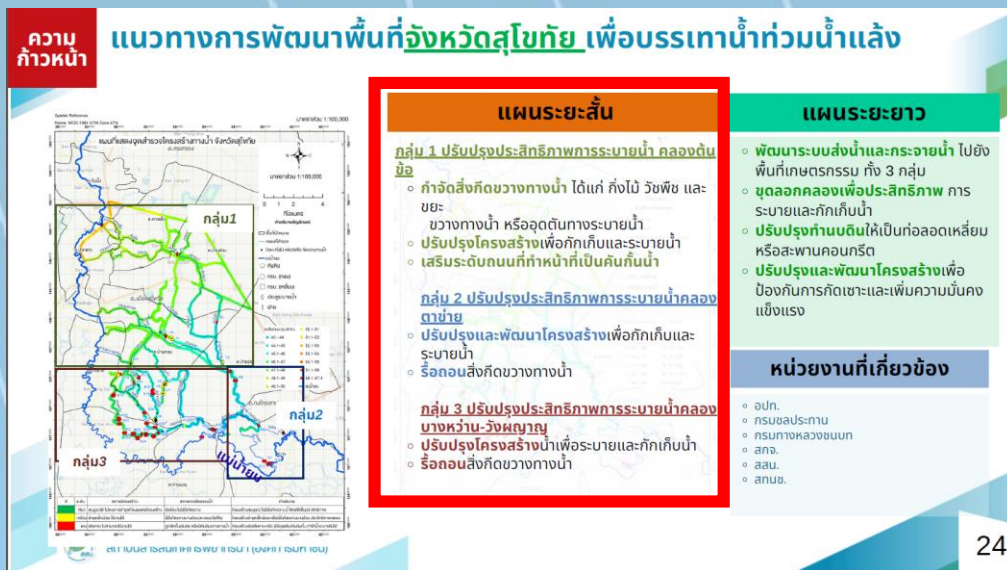

คลอง 3 แห่ง ได้แก่


1.คลองบางหว่าน - ไม่มีแผนงาน

2.คลองตาข่าย - มีการพิจารณาโครงการ ปตร.2 แห่ง ในเขตตำบลบ้าน

หลุม อำเภอเมืองสุโขทัย และตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ โดยตั้งแผนงาน ปี71

3.คลองต้นซ้อ - ซ่อมแซมประตูระบายน้ำกลางคลองต้นซ้อ กม.6+500

ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (งบเหลือจ่าย69)

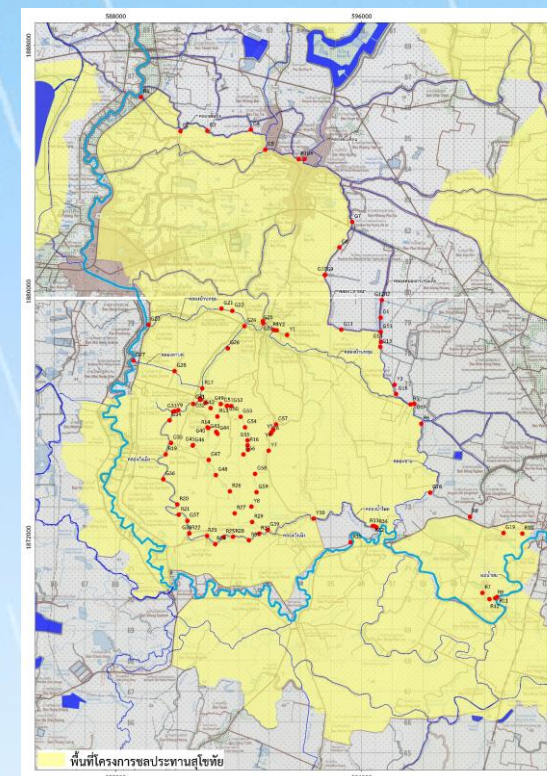

ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน
ปรับตัว รับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อคุณภาพชีวิต **ที่ดีกว่าเดิม**

