



## เอกสารประกอบการตรวจราชการ

คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ

ตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดอุดรธานี

ลงพื้นที่ติดตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง

สายอด.3072 แยกทล.210 – บ้านดงมีชัย

ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร

สัญญาเลขที่ ขทช.อุดรธานี / 10 / 2568 ลงวันที่ 7 มกราคม 2568

ผู้ว่าจ้าง จังหวัดอุดรธานี โดย แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี



## แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการก่อสร้าง

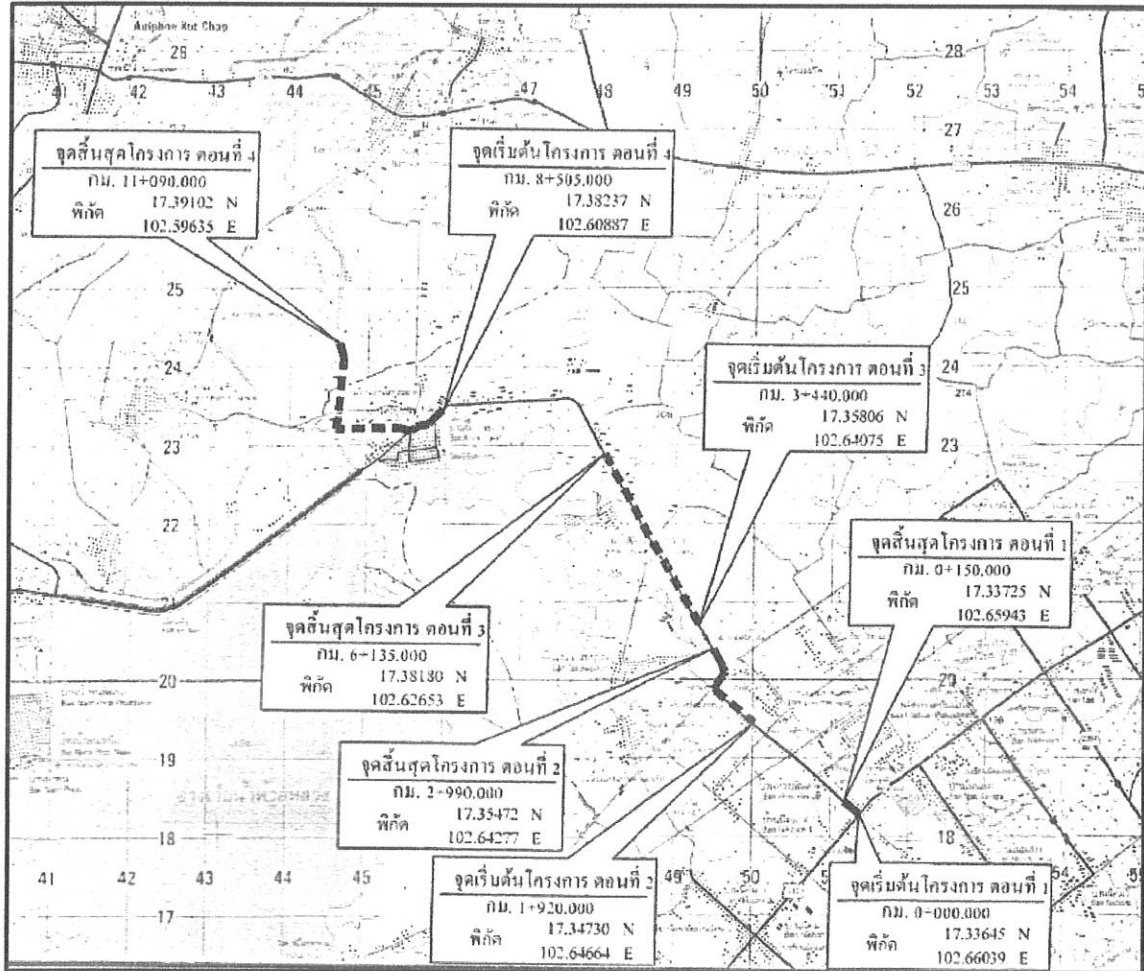

## แผนการดำเนินงาน

แผนงาน 10.63 % ( ข้อมูล ณ.วันที่ 10 มีนาคม 2568 )

ผลงาน 37.55 % เร็วกว่าแผน 26.92 % ( อยู่ในขณะดำเนินการ )

## รายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง

**ชื่อ-ที่ตั้งโครงการ**

กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.3072 แยกทล.210 – บ้านดงมีชัย

ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร

**ลักษณะโครงการ**

ผิวจราจร (เดิม) กว้าง	6.00	เมตร	ประเภทของผิวจราจร	AC.
ไหล่ทาง (เดิม) กว้างข้างละ	1.00	เมตร	ประเภทของผิวจราจร	AC.
ผิวจราจรกว้าง (ใหม่)	6.00 – 12.00	เมตร	ประเภทของผิวจราจร	Asphaltic Concrete
ไหล่ทาง กว้างข้างละ (ใหม่)	0.50 – 1.00	เมตร	ประเภทของผิวจราจร	Asphaltic Concrete
ระยะทางรวม	6.500	กิโลเมตร	ดำเนินการ จำนวน	4 ช่วง

**ราคาค่าก่อสร้าง**

29,990,000.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

**ผู้รับจ้าง**

บริษัท เค พี อาร์ พัฒนา จำกัด

**สัญญาจ้างเลขที่**

ขทช.อุดรธานี / 10 / 2568 ลงวันที่ 7 มกราคม 2568

**ระยะเวลาดำเนินการ**

150 วัน

เริ่มต้นสัญญาจ้าง วันที่ 8 มกราคม 2568 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 6 มิถุนายน 2568

**คณะกรรมการตรวจ  
การจ้าง**

ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ขทช.อุดรธานี /855/2567 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2567

1.นางสาวสุธาสิณี ปลั่งไหม	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนงานชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2.นายสุรวัฒน์ สอนตา	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนงานชำนาญการ	กรรมการ
3.นายเรืองยศ โตหนึ่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
4.นางสาวกัณฑ์ฤทัย แสงพร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
5.นายอนุชิต หล้ากำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

**ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง**

ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ขทช.อุดรธานี /113/2568 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. นายเจษฎากร ศรีคำมูล         | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |
| 2. นายทนต์ศักดิ์ พันธุ์หมานนท์ | นายช่างโยธา (พร.)    |

## รูปภาพการก่อสร้าง (ก่อนดำเนินการ)

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.3072 แยกทล.210 – บ้านดงมีชัย  
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร

(ตอนที่.1 ช่วง กม.0+000 – 0+150)



กม.0+000 (จุดเริ่มต้นโครงการ ตอนที่.1)



กม. 0+150 (จุดสิ้นสุดโครงการ ตอนที่.1)

(ตอนที่.2 ช่วง กม.1+920 – 2+990)




กม.1+920 (จุดเริ่มต้นโครงการ ตอนที่.2)



กม. 2+200



กม.2+400

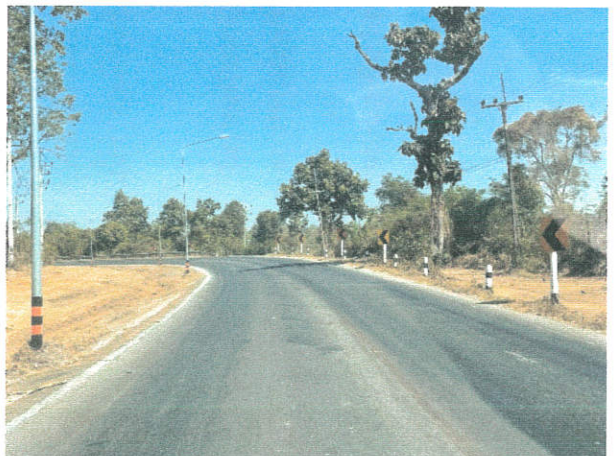

กม. 2+600



กม.2+800



กม. 2+990 (จุดสิ้นสุดโครงการ ตอนที่.2)

(ตอนที่.3 ช่วง กม.3+440 - 6+135)



กม.3+440 (จุดเริ่มต้นโครงการ ตอนที่.3)




กม. 3+600




กม.3+800




กม. 4+000

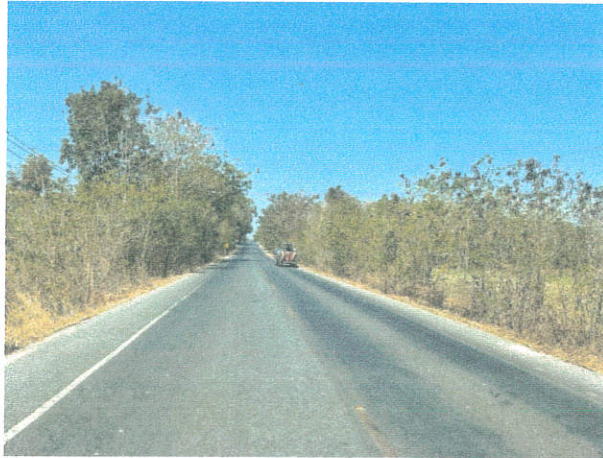

កង. 4+200

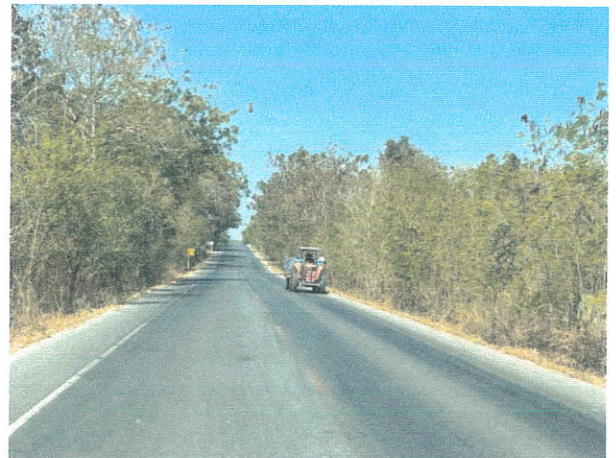

កង. 4+400

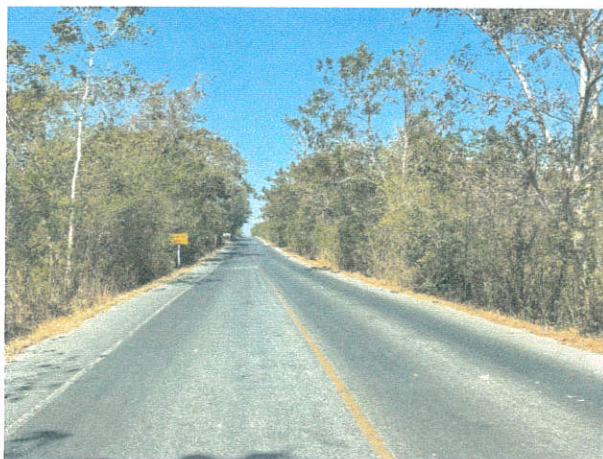

កង. 4+600



កង. 4+800



កង. 5+000




កង. 5+200




กม. 5+400




กม. 5+600

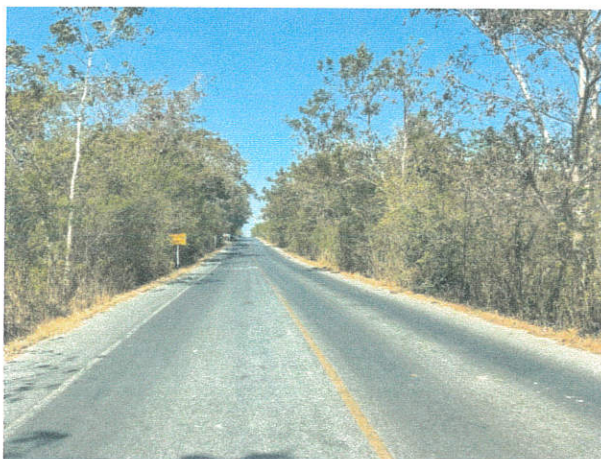

กม. 5+800

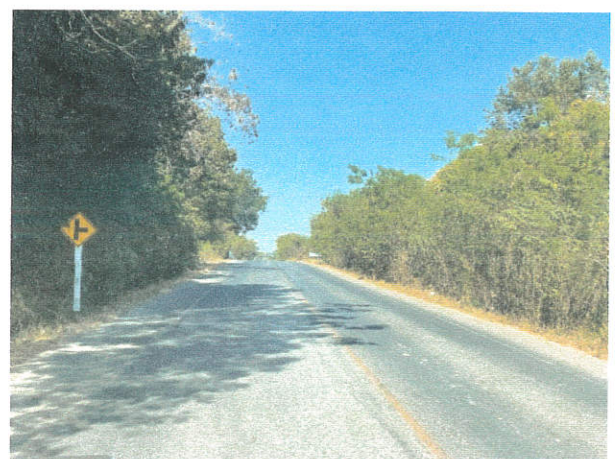

กม. 6+000

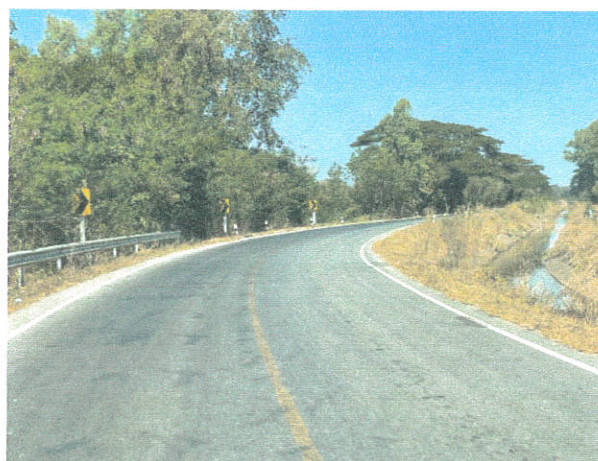

กม. 6+135 (จุดสิ้นสุดโครงการ ตอนที่.3)



(ตอนที่.4 ช่วง กม.8+505 - 11+090)



กม.8+505 (จุดเริ่มต้นโครงการ ตอนที่.4)




กม. 8+600




กม.8+800




กม. 9+000

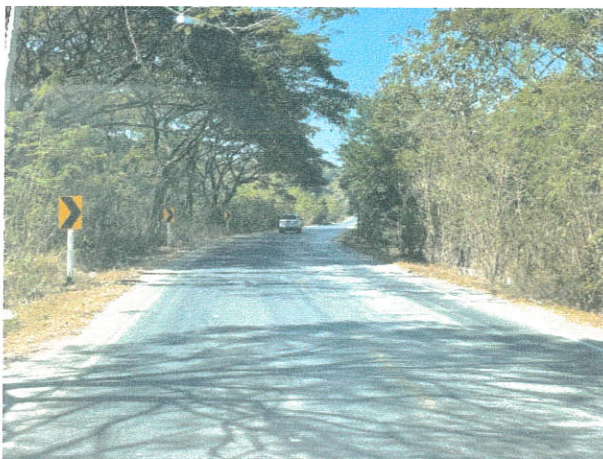


กม. 9+200

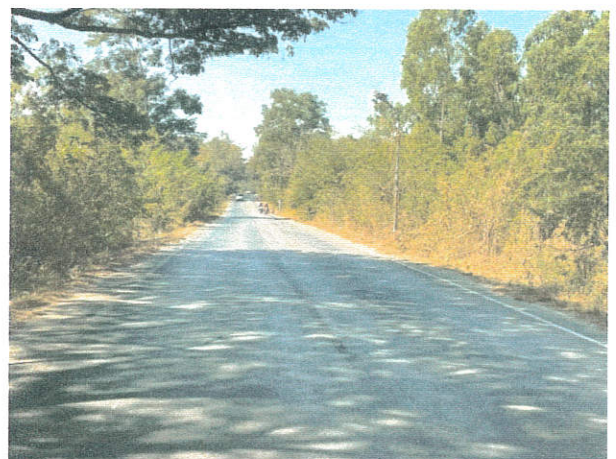

กม. 9+400

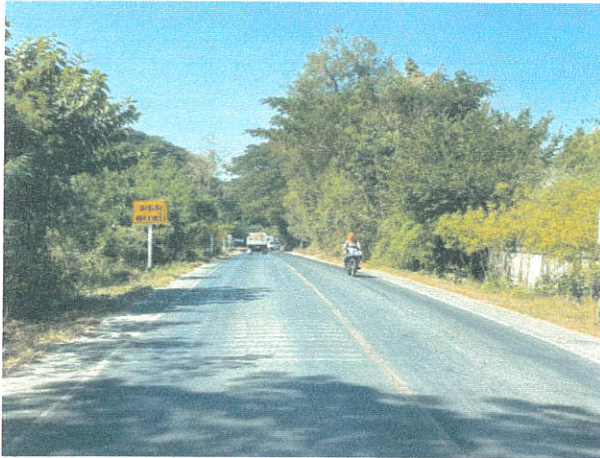

กม.9+600

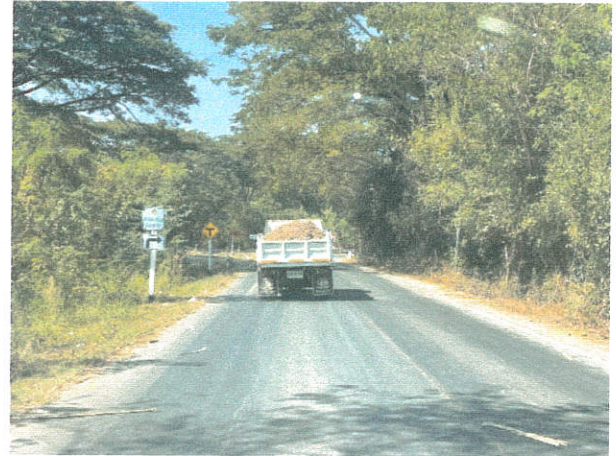

กม. 9+800



กม. 10+000



กม. 10+200



กม. 10+400



กม. 10+600



กม.10+800



กม. 11+000



กม. 11+090 (จุดสิ้นสุดโครงการ ตอนที่.4)

## รูปภาพประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.3072 แยกทล.210 – บ้านดงมีชัย  
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร  
ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด



# รูปภาพขณะดำเนินการ


กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.3072 แยกทล.210 – บ้านดงมีชัย  
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร



## รูปภาพขณะดำเนินการ

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.3072 แยกทล.210 – บ้านดงมีชัย  
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร


( งานสะพานคสล. )

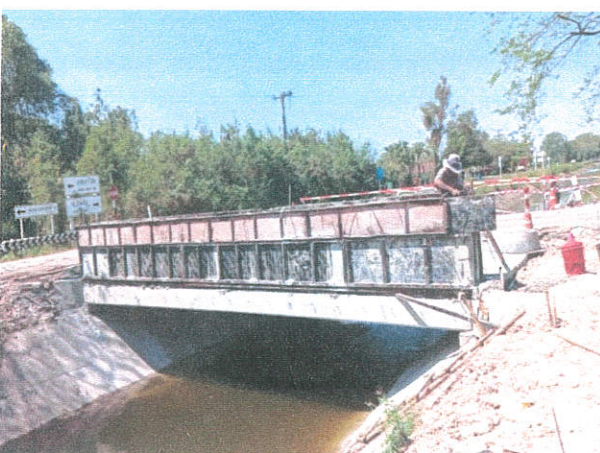

## รูปภาพขณะดำเนินการ

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.3072 แยกทล.210 – บ้านดงมีชัย  
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร

( งานไฟฟ้าแสงสว่าง )

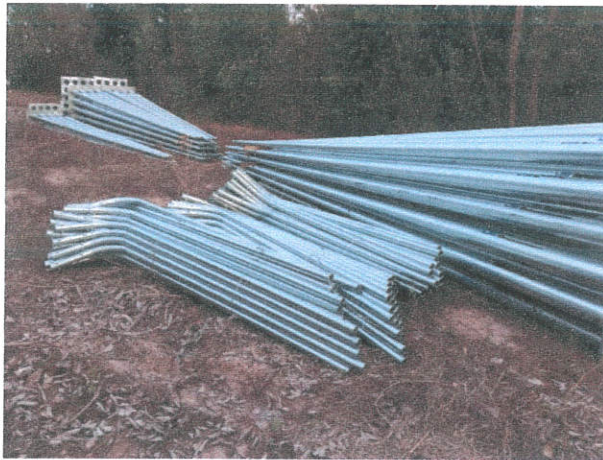

# รูปภาพขณะดำเนินการ

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.3072 แยกทล.210 – บ้านดงมีชัย  
ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร





# รูปภาพป้ายอำนวยความสะดวกปลอดภัย

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง สายอด.3072 แยกทล.210 – บ้านดงมีชัย

ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 6.500 กิโลเมตร

